

研发产品测试 - 需求CR #1441

DU新增打桩sib1机制(测试双band)

2023-11-28 17:56 - 匿名用户

状态:	已解决	开始日期:	2023-11-28
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	DU	CPU类型:	
目标解决问题版本:	Rel_2.1.15P		
描述			
增加sib1的打桩机制，测试双band下的UE接入和业务情况			

历史记录

#1 - 2023-11-28 17:57 - 匿名用户

- 状态 从 新建 变更为 进行中

代码修改完成50%


#2 - 2023-12-05 15:30 - 匿名用户

- 文件 band125.jpg 已添加

- 状态 从 进行中 变更为 转测试

sib1打桩测试代码已完成，
增加了三个配置值：
<SIB1_STUB_ENABLE>false</SIB1_STUB_ENABLE>
<SIB1_STUB_PERIOD>640</SIB1_STUB_PERIOD>
<SIB1_STUB_BAND>125</SIB1_STUB_BAND>

分别是开关，周期，以及打桩的band；
测试结果：mate30手机能够在sib1中包含band78时接入，并且后续ping包没问题，不会断。
如果飞行时，收到sib1为band 125，mate30无法接入。

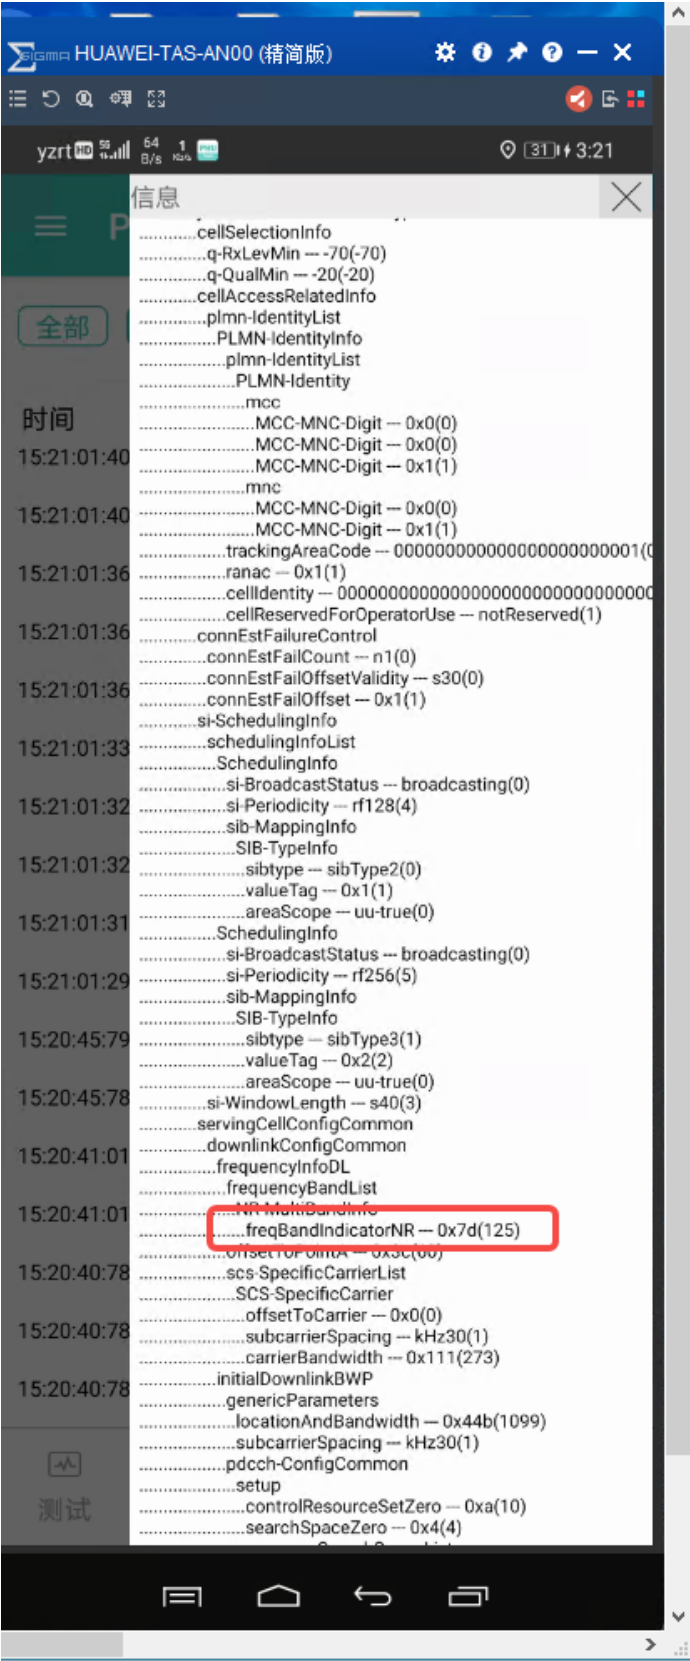

#3 - 2023-12-05 15:31 - 匿名用户
代码已更新到DU最新代码，默认配置为关闭该打桩功能。

#4 - 2024-02-18 10:48 - 匿名用户
- 状态从 转测试 变更为 已解决

文件

band125.jpg	289 KB	2023-12-05	匿名用户
-------------	--------	------------	------
